CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Bức tranh tổng thể về QLDA


Khởi động dự án

Hoạch định dự án

Tổ chức dự án

Kiểm soát dự án

Kết thúc dự án

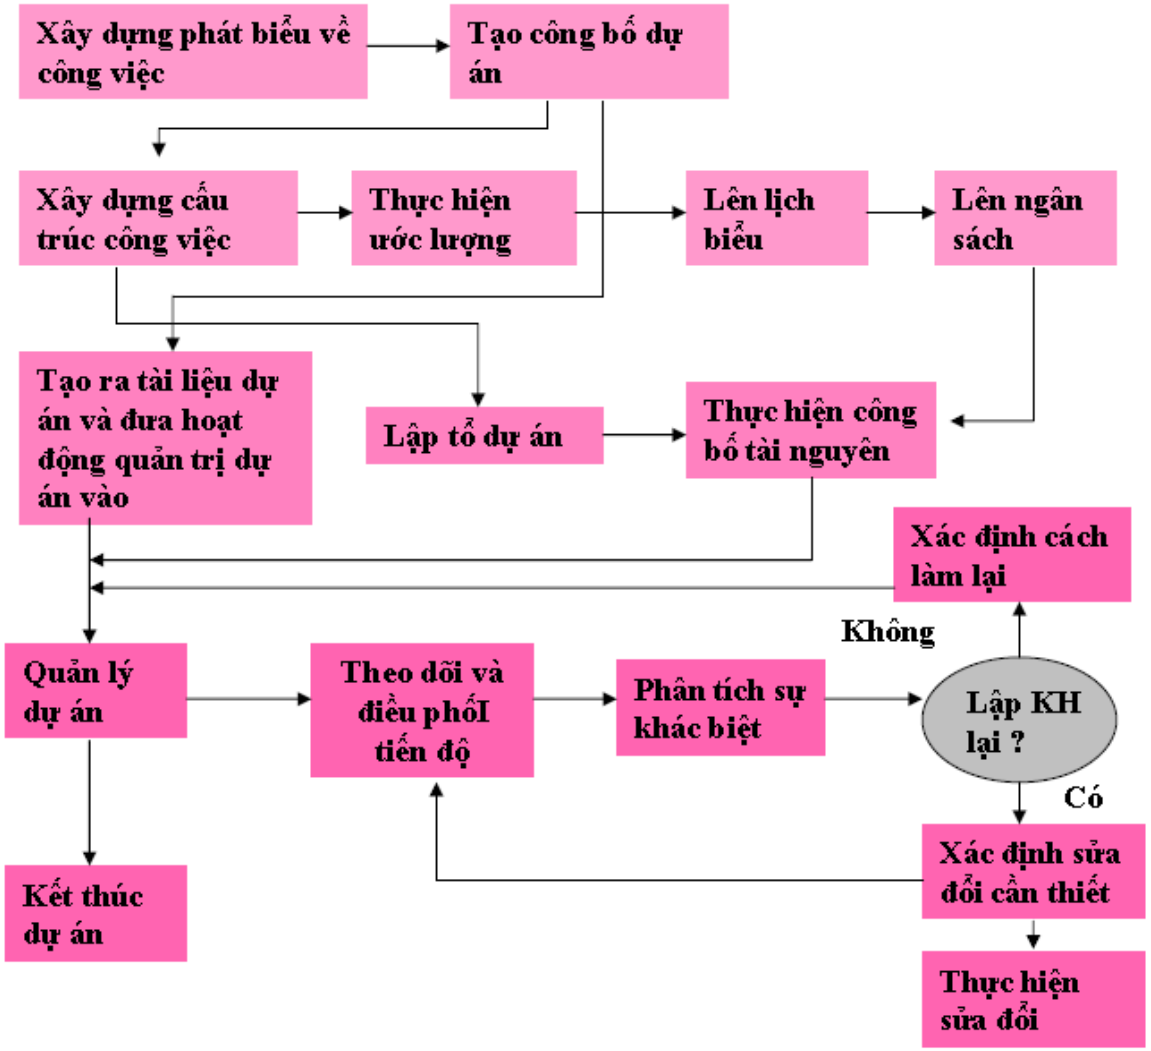

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

- Dự án là gì?
  - Dự án là "một nỗ lực tạm thời được cam kết để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ" (PMBOK guide 2000)
  - Dự án là một chuỗi các công việc (nhiệm vụ, hoạt động) được thực hiện bởi một tập thể nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong điều kiện ràng buộc về phạm vi, thời gian và ngân sách

Dự án là gì?

- Tập thể:
  - Có chuyên môn khác nhau
  - Công việc khác nhau
  - Thời gian tham gia khác nhau
  - Cùng phối hợp
- Kết quả:
  - Đặc tính/đặc điểm của kết quả
  - Giá trị sử dụng và hiệu quả

Dự án là gì?

- Thời gian:
  - Thời gian bắt đầu
  - Thời gian kết thúc
  - Mốc trung gian (thời điểm trung gian)

- Kinh phí:
  - Vốn đầu tư cho dự án
  - Có thể cấp thành nhiều giai đoạn

Dự án là gì?

- ***Đặc trưng của một dự án*:**
  - Mục tiêu của dự án
  - Thời gian dự án
  - Kinh phí của dự án
  - Nguồn nhân lực
  - Kết quả chuyển giao của dự án

Dự án là gì?

- ***Phân loại dự án:***
  - *Theo tầm cỡ dự án:*
    - Dự án lớn
    - Dự án trung bình và nhỏ
  - *Theo nội dung của dự án*
  - *Dự án một người hay dự án nhiều người*
  - *Nội bộ hay bên ngoài*

Các vấn đề thường xẩy ra với dự án

- Không hoàn thành đúng hạn
- Vượt dự toán
- Chất lượng không đảm bảo

Quản lý dự án

- **Quản lý dự án bao gồm**:
  - Lập kế hoạch
  - Quản lý các rủi ro
  - Quản lý nhân sự
  - Điều hành và theo dõi tiến độ thực hiện dự án
  - ….
- **Mục đích của quản lý dự án:**
  - Đảm bảo cho dự án được thực hiện thành công.

Đánh giá dự án thành công

Dự án thành công phải đáp ứng 4 vấn đề cơ bản:

- Sản phẩm cuối cùng của dự án thực sự đáp ứng các yêu cầu của người dùng, đảm bảo thời gian và kinh phí không vượt quá 10-20% dự tính ban đầu;
- Người dùng hài lòng với quá trình thực hiện dự án, thực sự tham dự và góp phần công sức của mình trong các hoạt động của dự án.

Đánh giá dự án thành công

- Các cấp quản lý phía trên của dự án (Ban lãnh đạo) được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình thực hiện dự án.

- Những người thực hiện dự án cũng phấn khởi, không bị quá gò bó, tích luỹ được kinh nghiệm, tăng thêm thu nhập...

Các vấn đề cần quản lý

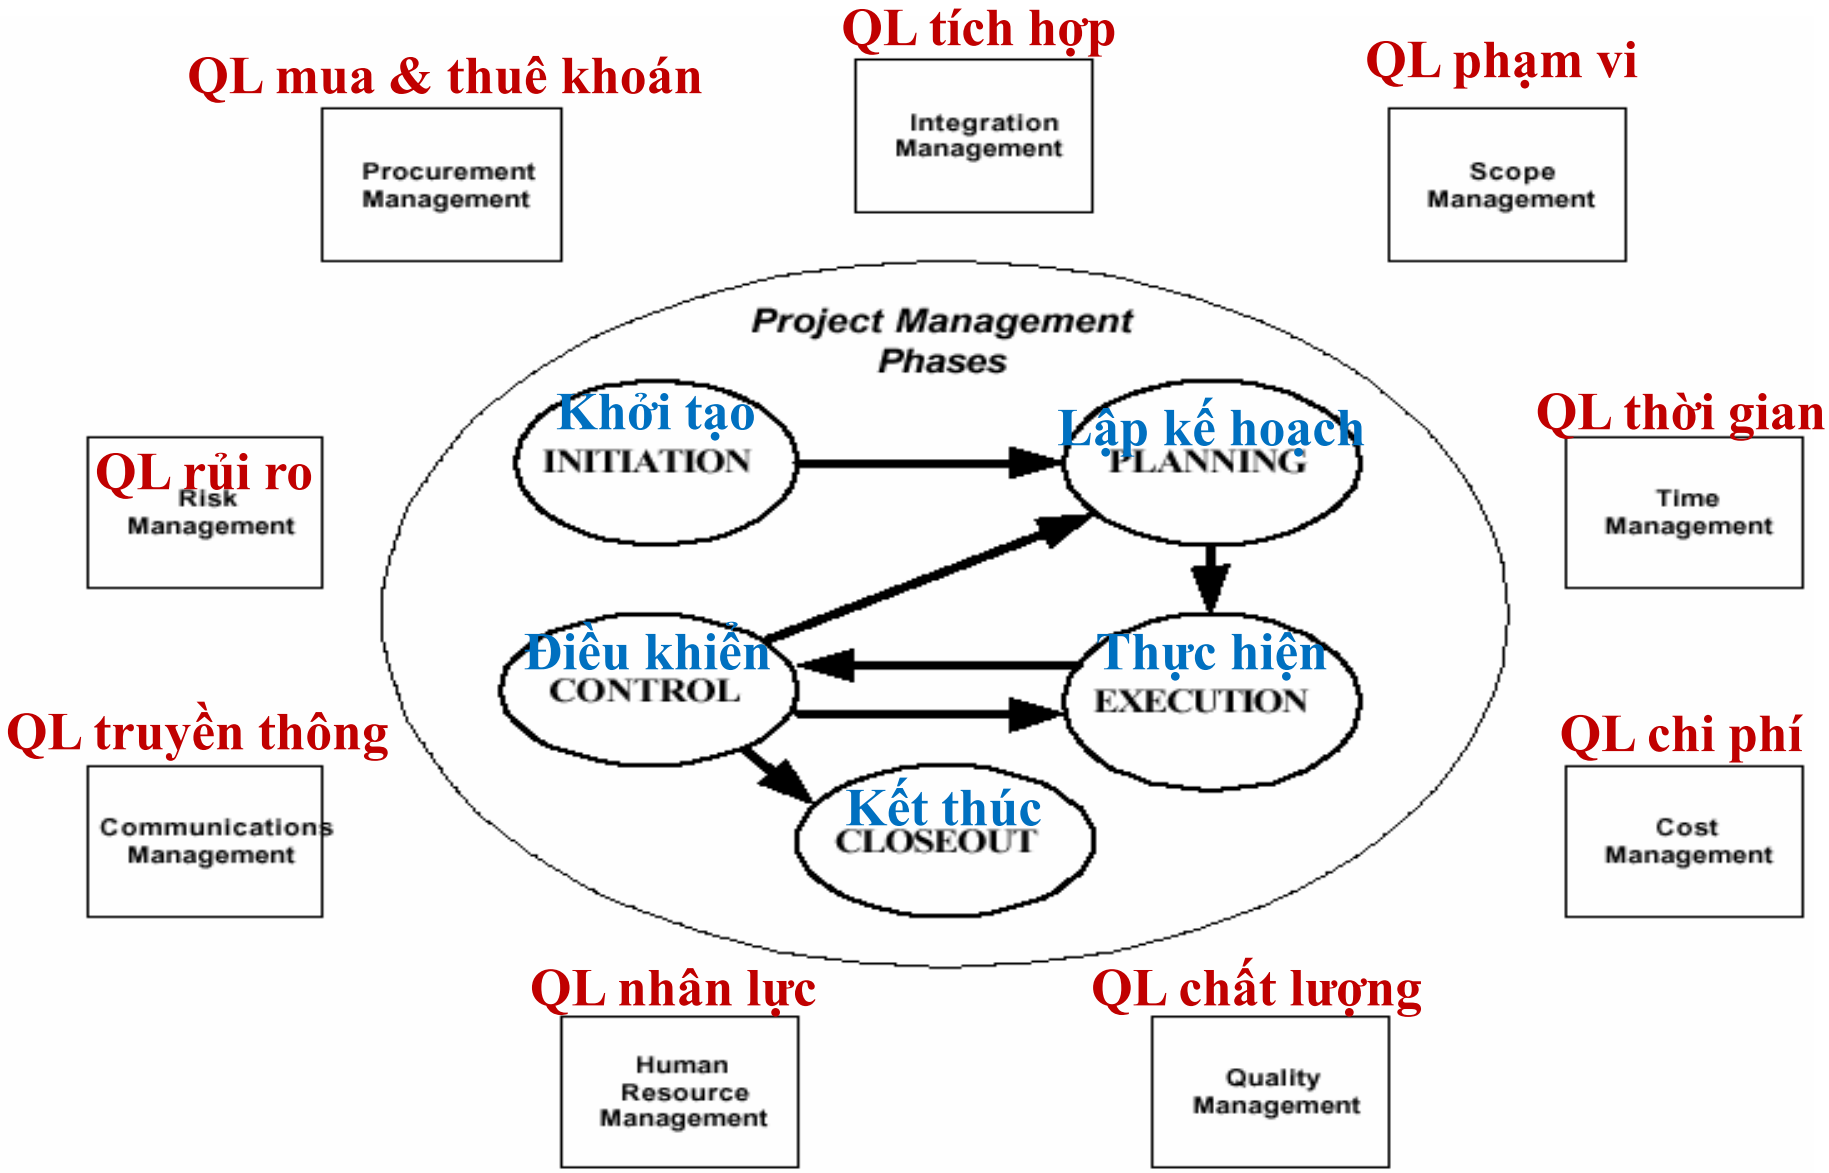


Figure 1.1

Biểu đồ về mức độ hoạt động của dự án



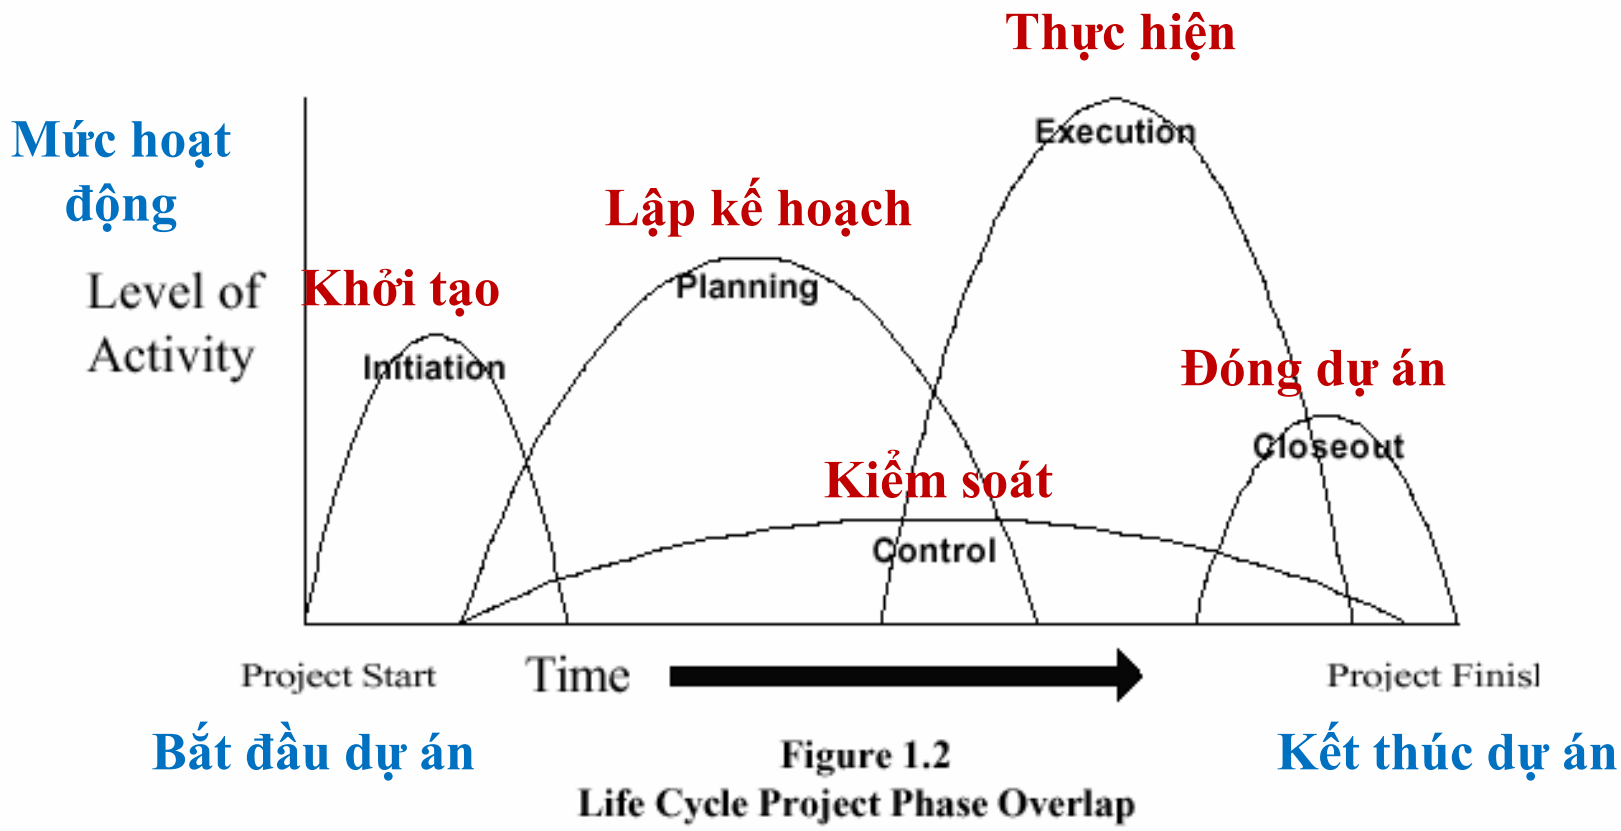


Figure 1.2
Life Cycle Project Phase Overlap


Mối quan hệ giữa chu trình xây dựng hệ thống với các pha của dự án

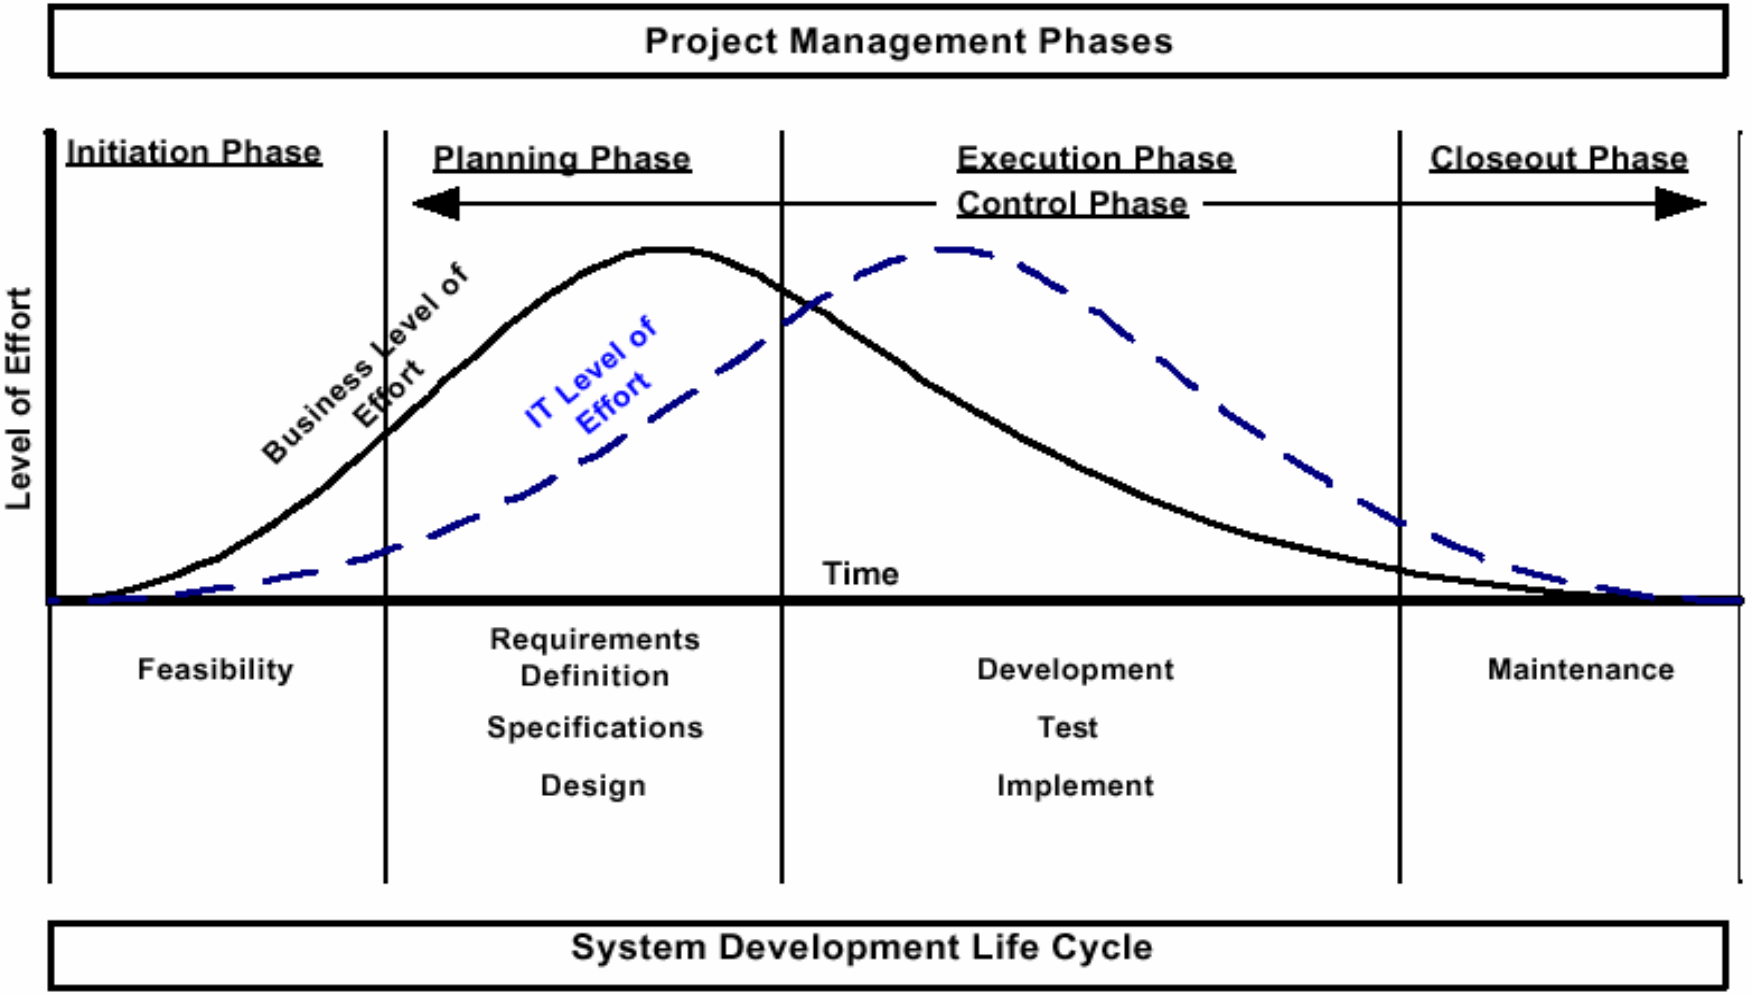


Công việc khởi động dự án

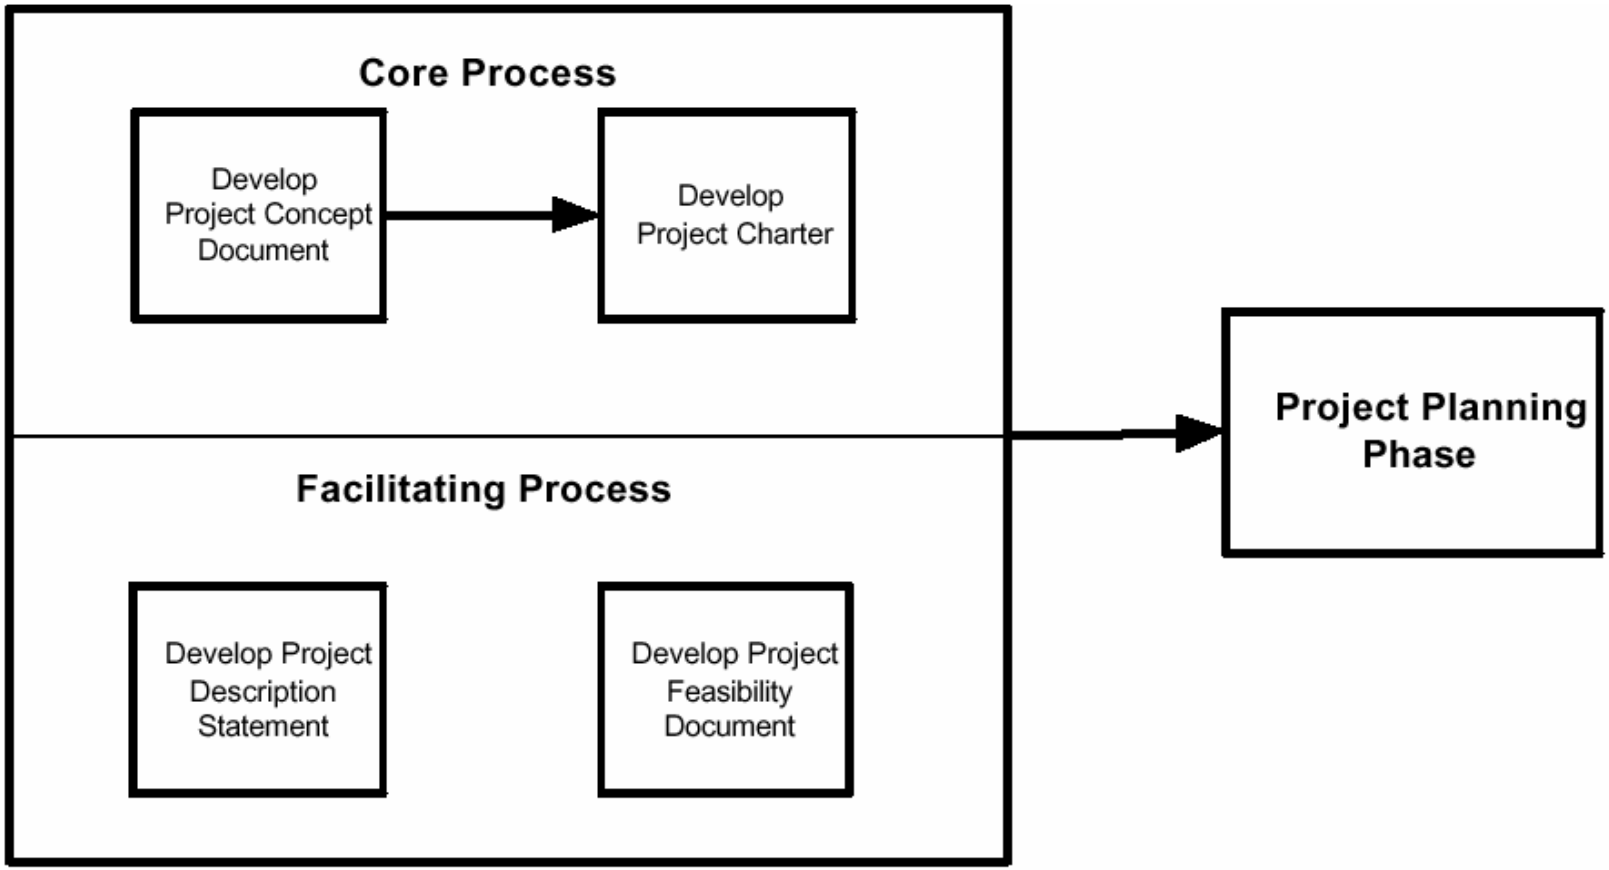


Các bên tham gia dự án

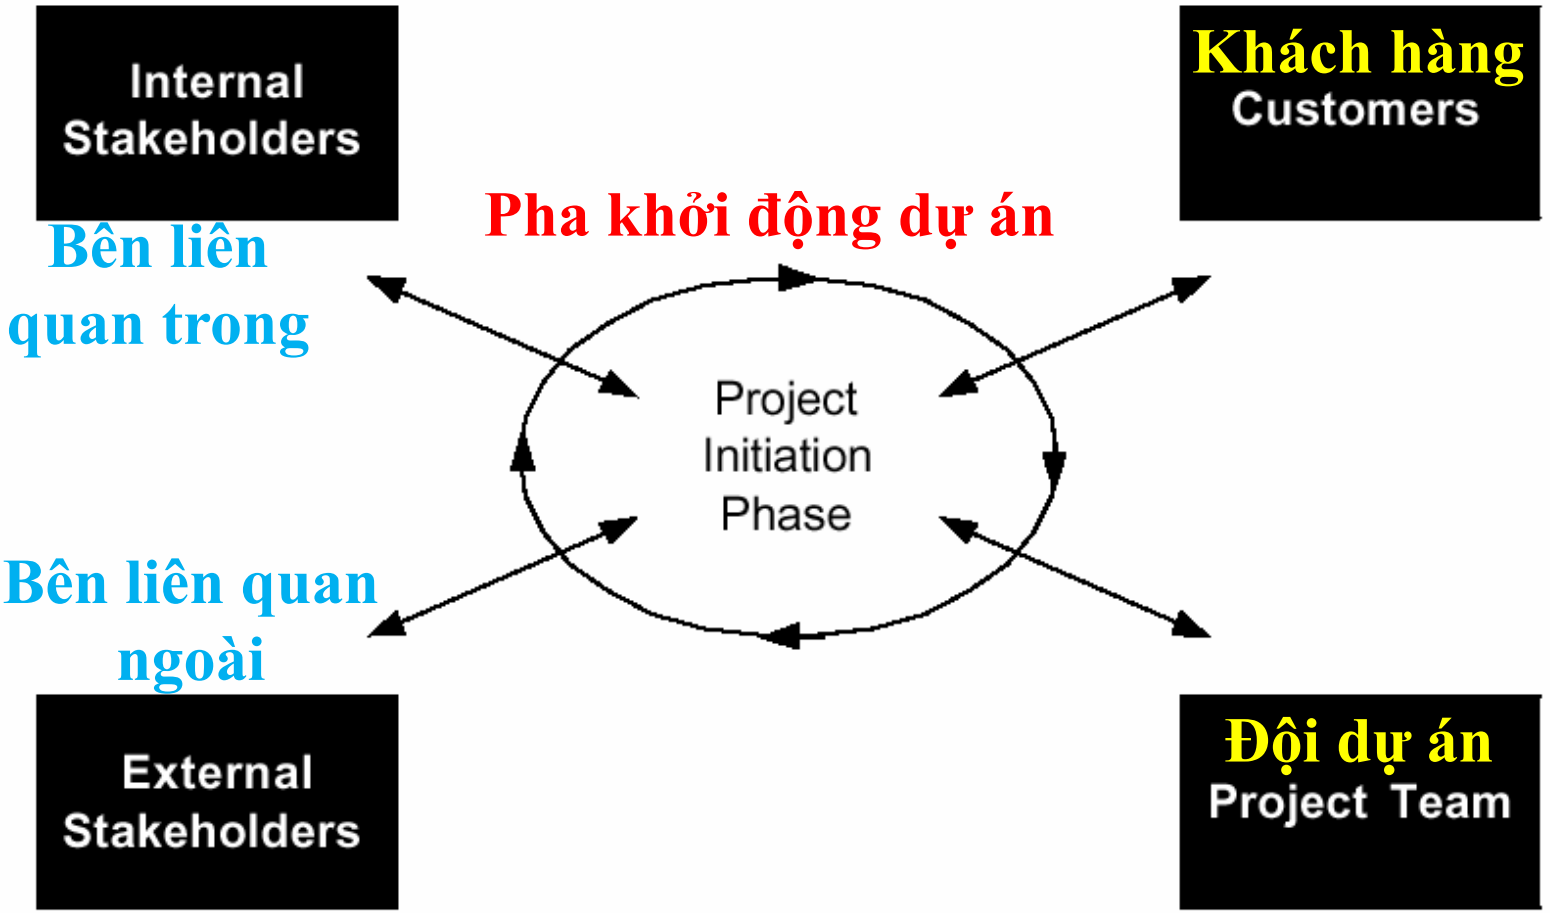


Các câu hỏi đặt ra trong giai đoạn khởi động

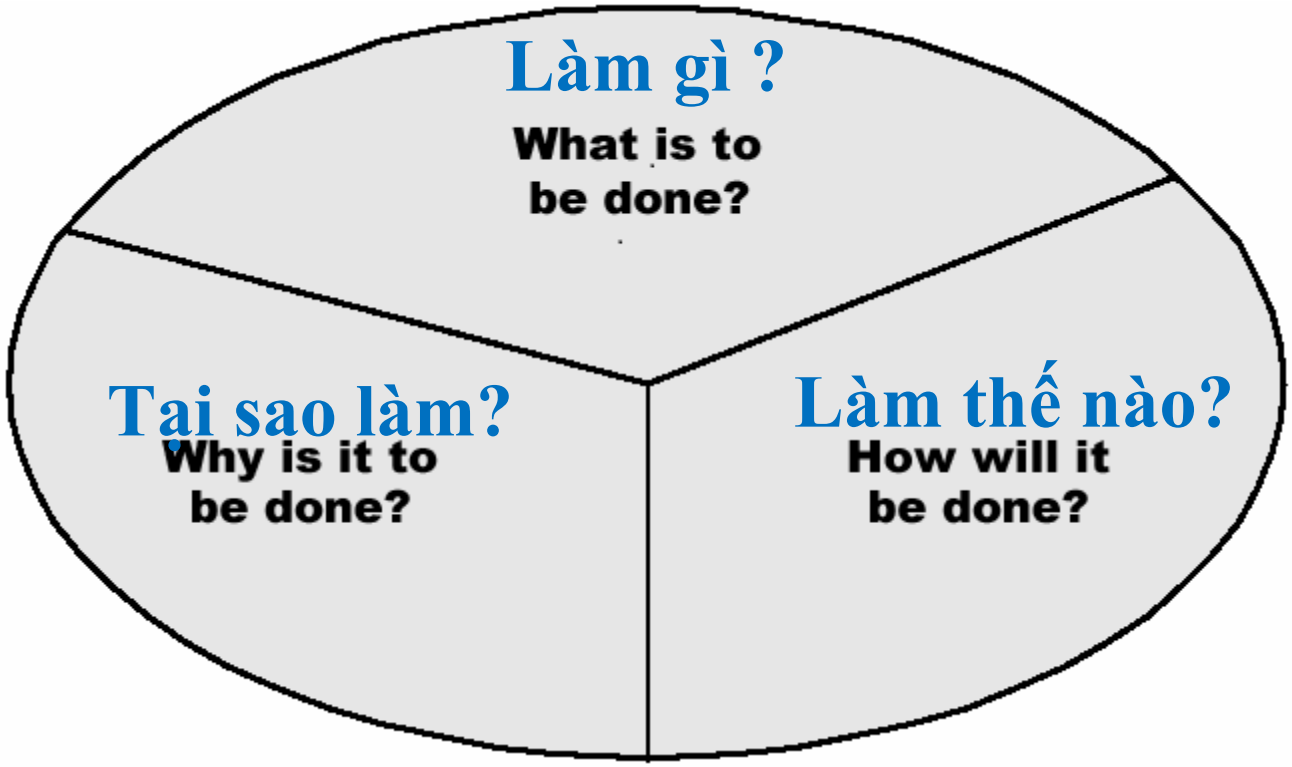


Các tài liệu cần thiết cho giai đoạn xác định dự án

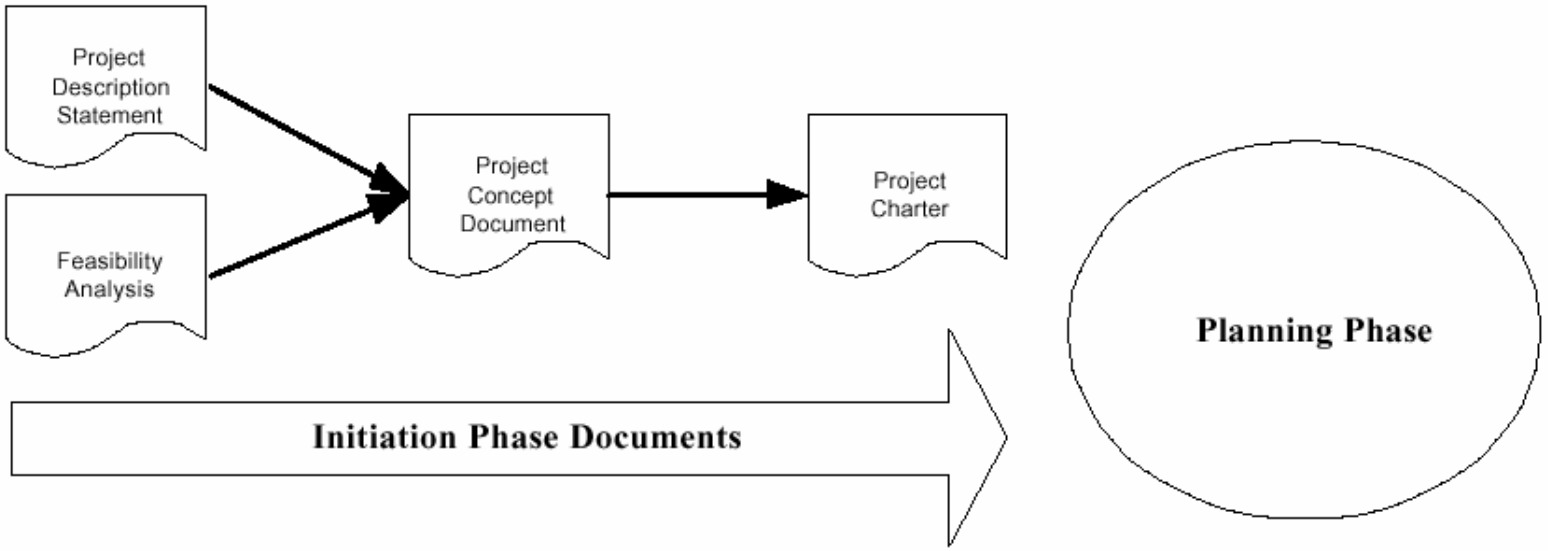

Thứ tự các bước chuẩn bị tài liệu

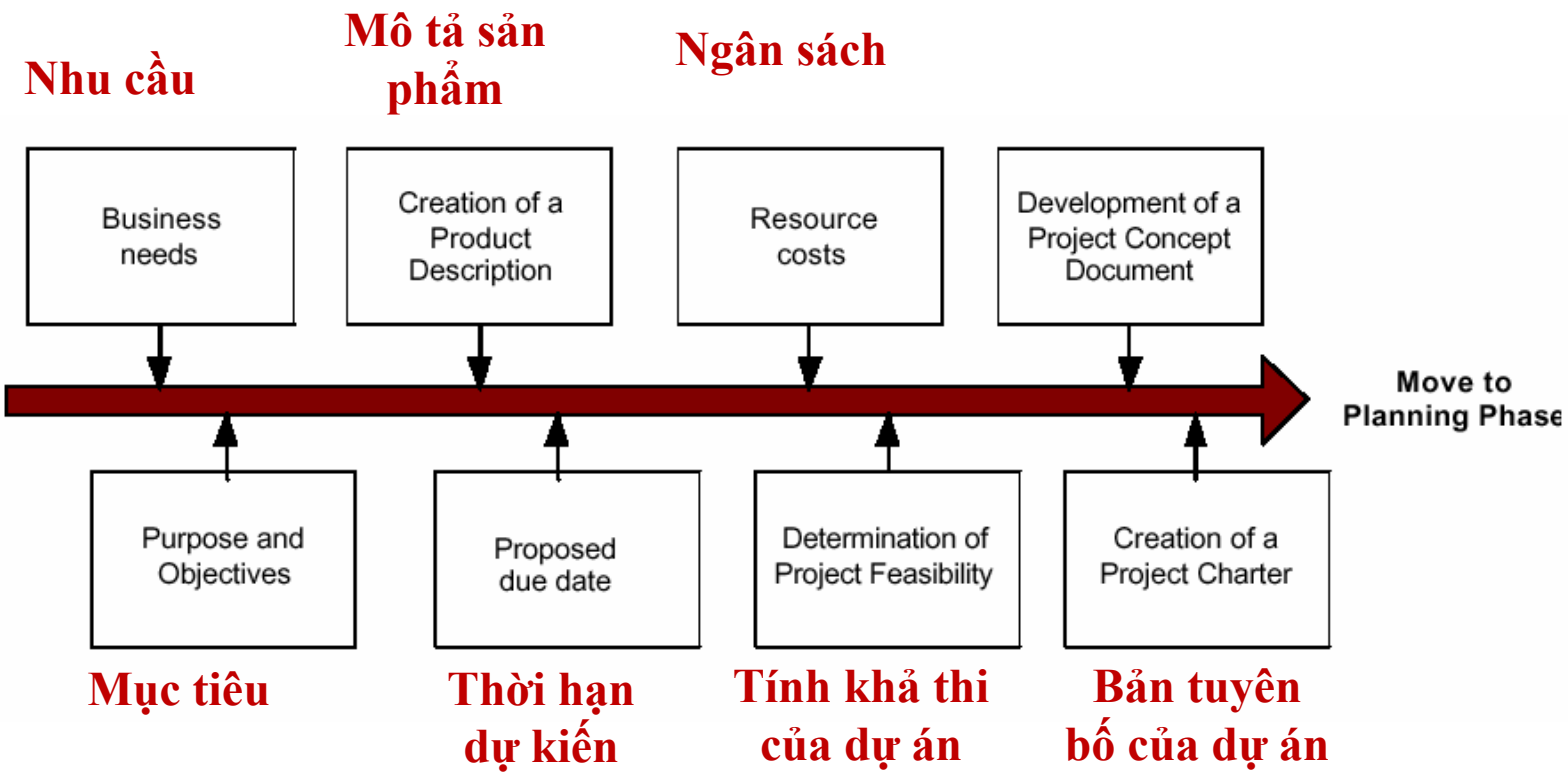

Qui trình lập kế hoạch

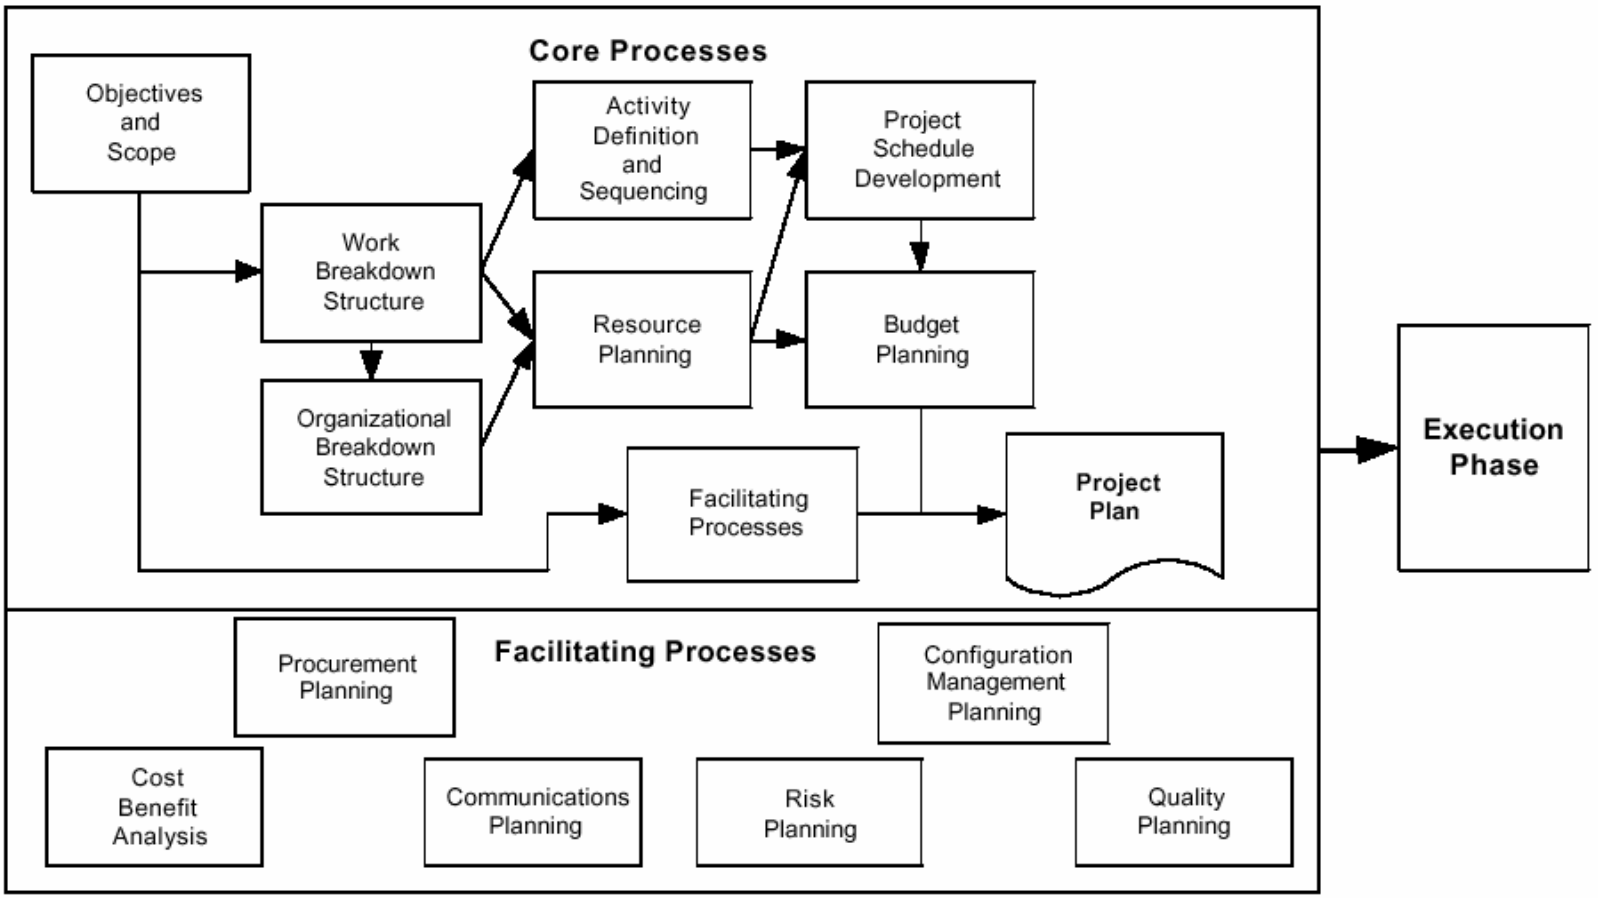


TẠI SAO DA THÀNH CÔNG

- Đúng thời hạn, trong phạm vi, kinh phí cho phép
  - Vượt quá khoảng 10% - 20% được coi là chấp nhận được
- Nhóm thực hiện không cảm thấy bị kiểm soát quá mức
- Khách hàng thỏa mãn
  - Sản phẩm DA giải quyết được yêu cầu của khách hàng
  - Được tham gia vào dự án
- Người quản lý hài lòng với tiến độ

CÁC LỢI ÍCH CỦA QLDA

- Kiểm soát tốt hơn các tài nguyên tài chính, thiết bị và con người
- Cải tiến quan hệ với khách hàng
- Rút ngắn thời gian triển khai
- Giảm chi phí
- Tăng chất lượng và độ tin cậy
- Tăng lợi nhuận
- Cải tiến năng suất
- Phối hợp nội bộ tốt hơn
- Nâng cao tinh thần làm việc

QUẢN LÝ DỰ ÁN LÀ GÌ

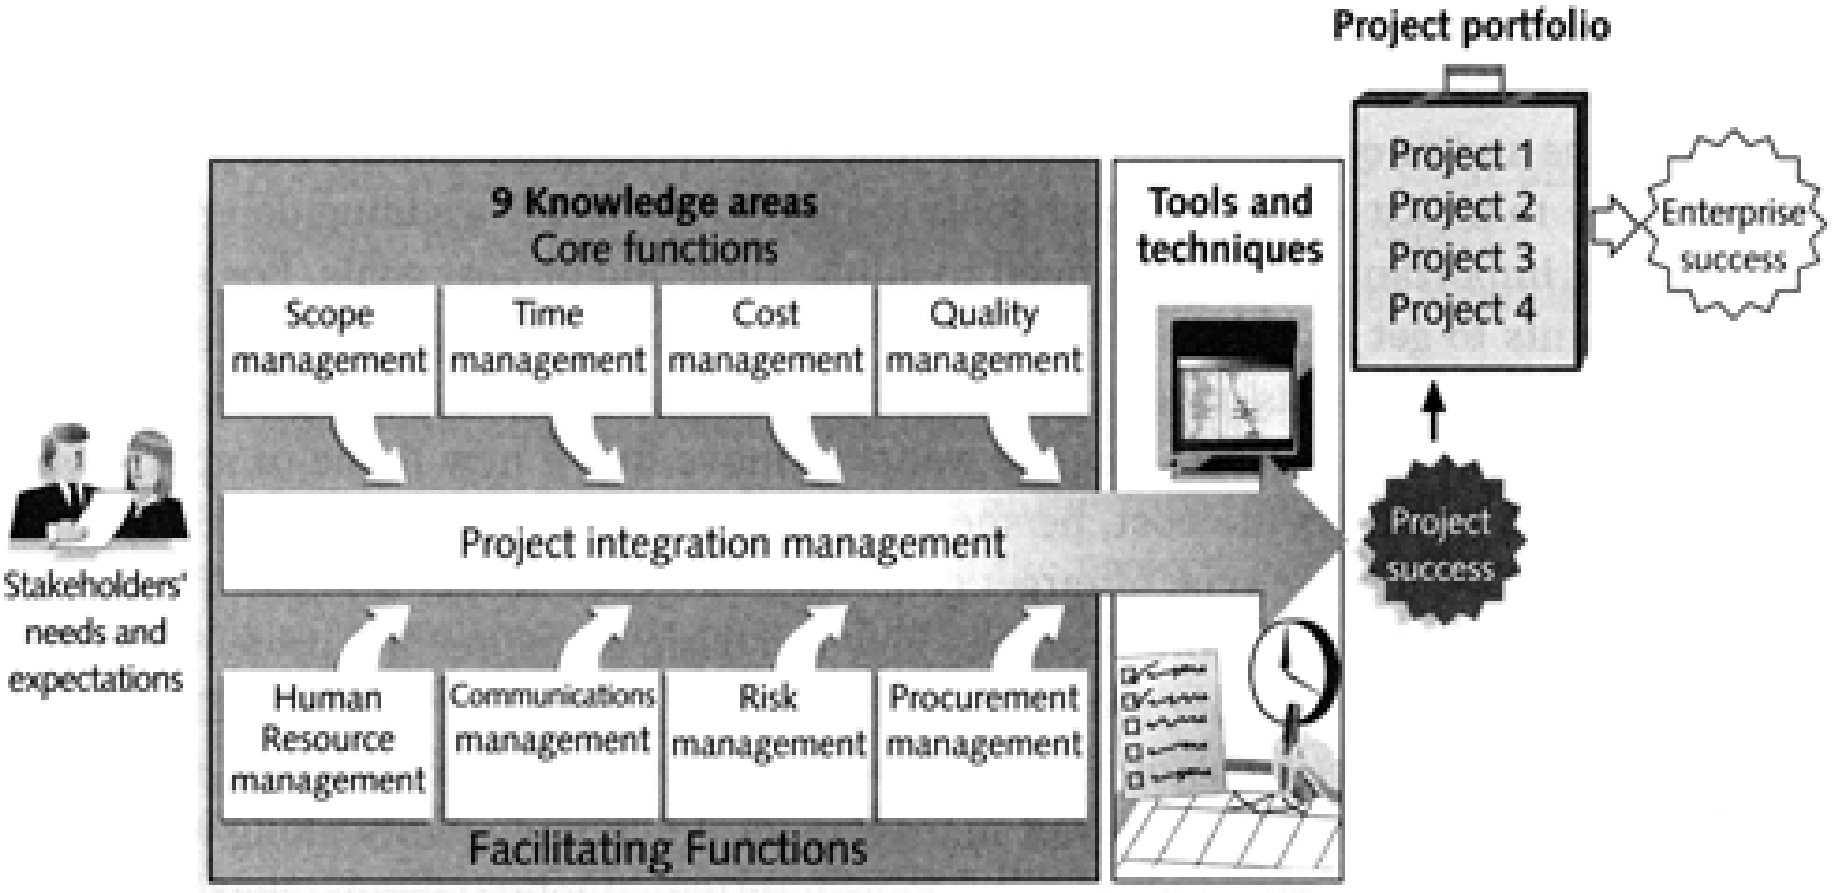

CÁC BÊN THAM GIA (LIÊN QUAN)

- Các bên tham gia (stakeholder) là tất cả những ai có liên quan hay bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của dự án

Gồm:

- QL dự án
- Trưởng nhóm kỹ thuật
- Các trưởng nhóm
- Các nhóm triển khai
- Khách hàng
- Người dùng
- Nhà cung cấp
- Những người chống lại dự án

9 LĨNH VỰC TRONG QLDA

Mô tả các năng lực chủ yếu người quản lý dự án cần phát triển:

- 4 lãnh vực cơ bản: phạm vi – thời gian – chi phí – chất lượng
  - QL phạm vi: xác định và quản lý tất cả các công việc
  - QL thời gian: ước lượng thời gian, lập lịch biểu và theo dõi tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn tất đúng thời hạn
  - QL chi phí: đảm bảo hoàn tất dự án trong kinh phí cho phép
  - QL chất lượng: đảm bảo đúng chất lượng theo đúng yêu cầu đề ra

9 LĨNH VỰC TRONG QLDA

- 4 lãnh vực hỗ trợ: là phương tiện để truyền đạt các mục tiêu của dự án:
  - QL nguồn nhân lực
  - QL truyền thông
  - QL rủi ro
  - QL mua sắm trang thiết bị
- 1 lĩnh vực QL tích hợp: QL sự tác động và bị tác động bởi tất cả các lĩnh vực trên

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA DA CNTT

	Mục đích	Các hoạt động tron từng giai đoạn	Tiến hành	Tài liệu và các mốc điểm	Vai trò Người QLDA, CBKT
XÁC ĐỊNH	Tìm hiểu để có đánh giá khởi đầu.	Mục đích, mục tiêu Trình bày vấn đề. Đáng giá rủi ro. Kế hoạch & ước tính.	Quản Lý DA.	Ý tưởng về DA (NDùng Thông qua) Yêu cầu Ndùng. Bảng các Rủi ro Kế hoạch Khởi đầu. (Các Thành viên thông qua) Hiến chương DA (NDùng thông qua)	
PHÂNTÍCH	Hệ thống sẽ làm gì	Giao diện người dùng. Các điều khoản hợp đồng. Thiết kế ban đầu.	Xem xét,	Đặc tả Chức năng (Ndùng thông qua) Kế hoạch cuối cùng Đề xuất thực hiện (Ndùng thông qua)	
THIẾT KẾ	Các phần của Hệ thống, Hệ thống sẽ làm việc như thế nào.	Quyết định xây dựng/Mua. Thiết kế Xem xét kỹ lưởng.	Báo cáo Tình hình.	Đặc tả Thiết kế (Thông qua KT) Kế hoạch kiểm thử sự Chấp nhận Ước tính đã được xem xét ại. (Thông qua về Chất lượng)	

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA DA CNTT

	Mục đích	Các hoạt động tron từng giai đoạn	Tiến hành	Tài liệu và các mốc điểm	Vai trò Người QLDA, CBKT
THỰC HIỆN	Lắp ráp các thành phần	Lập trình. Xây dựng/Mua. Khách hàng hóa. Kiểm thử từng phần.	Quản Lý DA.	Thiết kế các Thành phần. (Thông qua KT) Kế hoạch Kiểm thử Hệ thống. (Thông qua KT) Các Thành phần đã được kiểm thử. (Thông qua KT). Tài liệu sữ dụng	
KIỂM THỬ HỆ THỐNG	Làm việc, Hệ thống hiệu chỉnh những sai sót.	Tích hợp. Kiểm tra chất lượng kỹ càng.	Xem xét,	Hệ thống làm việc Kiểm thử Hệ thống. Báo cáo (Thông qua về Chất lượng)	
KIỂM THỬ SỰ CHẤP NHẬN	Sự chấp nhận của khach hàng.	Qui trình Chấp nhận	Báo cáo Tình hình.	Kiểm thử sự Chấp nhận (Ndùng thông qua) Báo cáo (NDùng thông qua)	
VẬN HÀNH	Cài đặt rộng rãi và hoàn thành.	Cài đặt rộng rãi. Chuyển đổi. Đào tạo, Hỗ trợ, Xem xét.		Hệ thống mới có được dùng ? (Thư Ndùng) Báo cáo Đào tạo Kế hoạch Hỗ trợ. (Ndùng thông qua) Xem xét. Báo cáo hoàn thành DA.	

CHU TRÌNH SỐNG CỦA MỘT DA

Chu trình sống trong phát triển hệ thống (systems development life cycle – SDLC) là khung làm việc dùng để mô tả các giai đoạn trong quá trình phát triển và duy trì hệ thống. Chu trình sống của dự án là nhóm các giai đoạn của dự án. Các giai đoạn của DA thay đổi tùy theo dự án hoặc lĩnh vực kinh doanh, nhưng các giai đoạn chung gồm:

- Quan niệm (conception)
- Triển khai (development)
- Thực hiện, cài đặt (implementation)
- Kết thúc

CÁC QUY TRÌNH QL DA - 1

- Khởi động DA
- Lập kế hoạch DA
- Thực thi DA
- Kiểm soát & điều khiển
- Kết thúc
