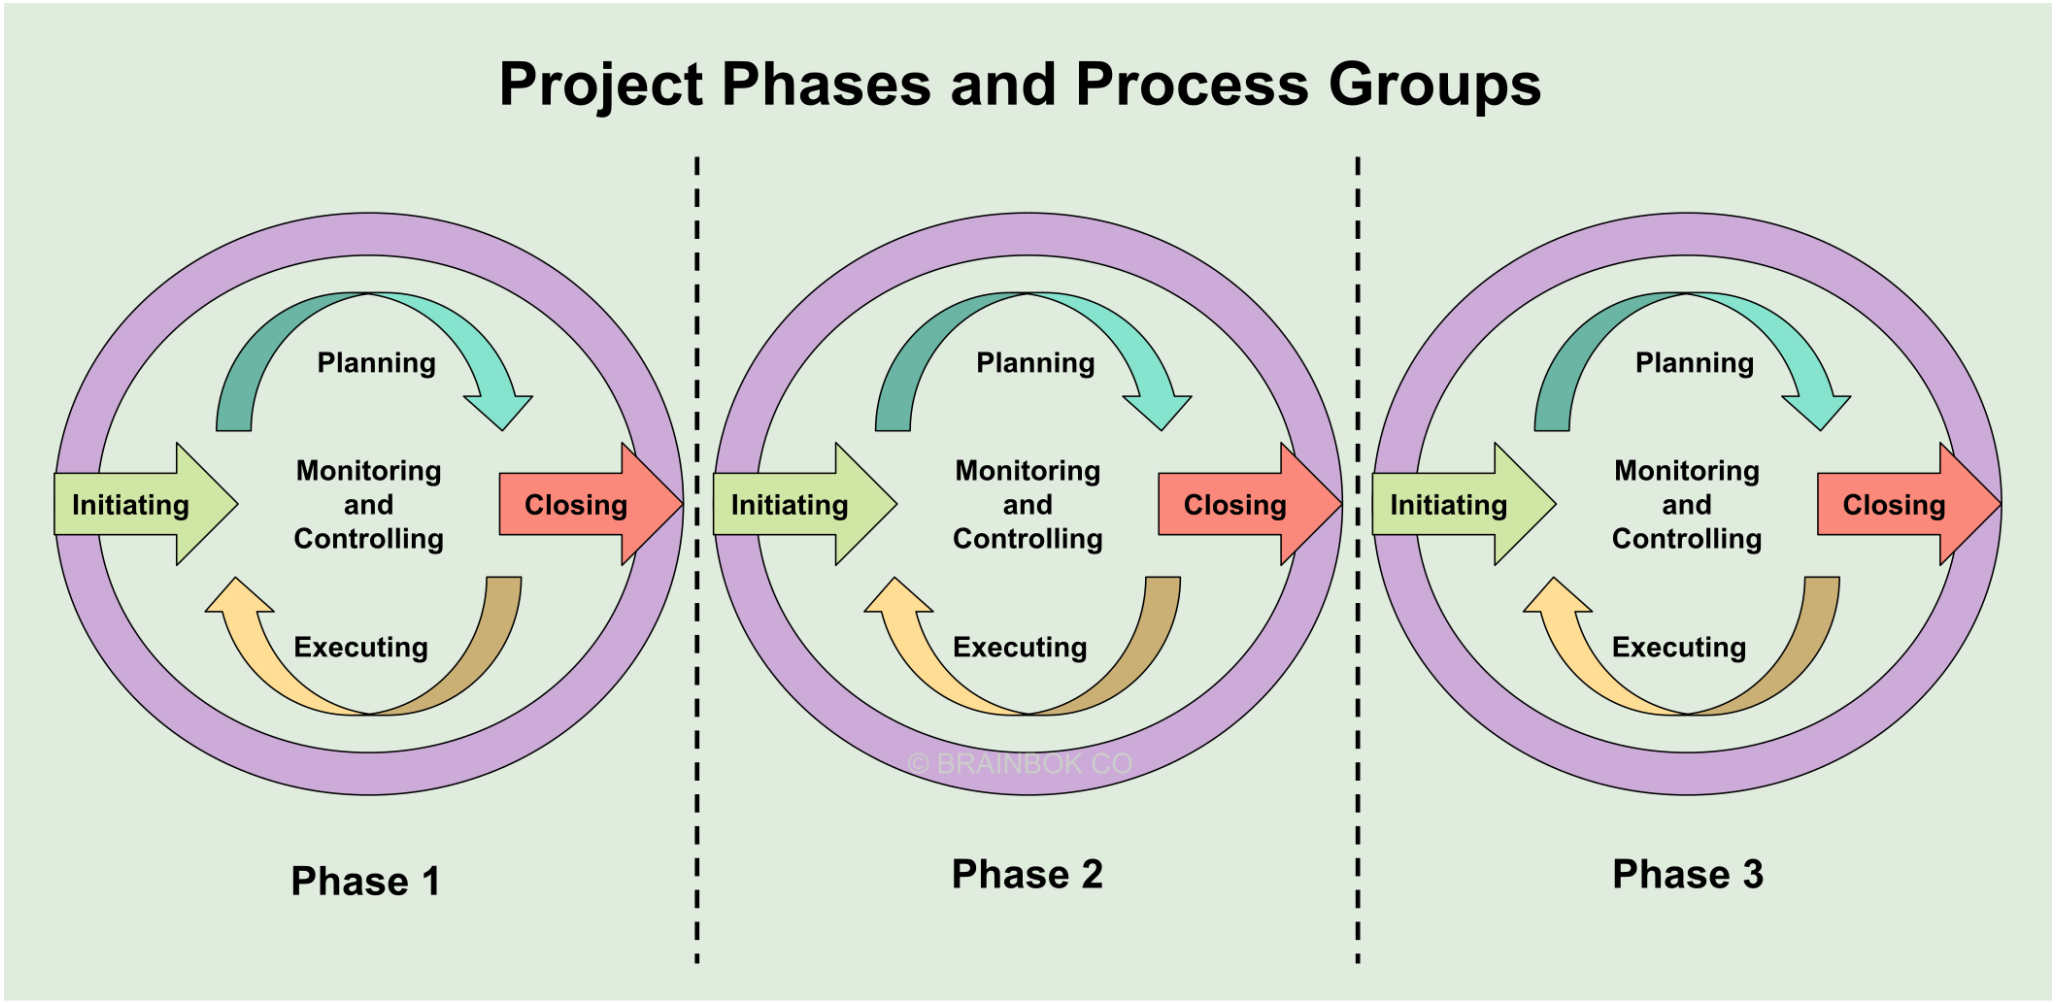
CHƯƠNG 6
ĐÓNG DỰ ÁN

Tổng quan

- Là **Giai đoạn Cuối cùng** trong Chu trình Quản lý Dự án.
- Bao gồm các quy trình cần thiết để **hoàn tất tất cả các hoạt động** trong Nhóm Quy trình Quản lý Dự án hoặc Pha dự án.

Mục tiêu chính:

- **Chuyển giao** sản phẩm/hệ thống CNTT cuối cùng.
- **Đạt được sự chấp thuận** chính thức từ khách hàng/nhà tài trợ.
- **Giải phóng** nguồn lực (nhân sự, thiết bị).
- **Đóng tất cả các hợp đồng** và tài khoản.
- **Ghi nhận** kiến thức dự án để cải tiến cho các dự án tương lai.


Project Phases and Process Groups
Planning
Initiating
Monitoring and Controlling
Closing
Executing
Phase 1
Phase 2
Phase 3
© BRAINBOK CO

Tầm quan trọng của Đóng dự án

- **Tránh rủi ro pháp lý/tài chính:** Đảm bảo mọi cam kết hợp đồng đều được hoàn thành và thanh toán.
- **Đảm bảo vận hành:** Chuyển giao hệ thống CNTT sang nhóm bảo trì/vận hành một cách suôn sẻ.
- **Bảo toàn tri thức:** Hệ thống CNTT phức tạp yêu cầu tài liệu hóa chi tiết kinh nghiệm phát triển để hỗ trợ bảo trì và nâng cấp trong tương lai.

Quy trình Đóng Dự án CNTT

- **Hoạt động chính: Thực hiện Đóng Dự án hoặc Pha**
- **Đầu vào (Inputs):** Các tài liệu và kết quả cần thiết để bắt đầu quy trình đóng:

1. Kế hoạch Quản lý Dự án: Cần thiết để xác nhận mọi quy trình đóng đã được thực hiện như dự kiến.

2. Sản phẩm đã được chấp thuận: Bằng chứng chính thức (ví dụ: Biên bản Nghiệm thu/Chấp thuận - UAT Sign-off) rằng hệ thống CNTT đã hoàn thành và khách hàng chấp nhận.

3. Tài liệu Dự án: Hồ sơ dự án (logs vấn đề, báo cáo hiệu suất) để tổng kết.

4. Dữ liệu Hiệu suất: Các chỉ số cuối cùng về tiến độ và chi phí (ví dụ: EVA cuối cùng).

Hoạt động chính

1. Thu thập Bài học Kinh nghiệm (Lessons Learned): Tổ chức họp tổng kết (retrospective) để phân tích thành công, thất bại và kiến thức thu được từ quá trình phát triển hệ thống.

2. Xác nhận Hoàn thành Phạm vi: So sánh kết quả cuối cùng với **Đường cơ sở Phạm vi (Scope Baseline)** để đảm bảo tất cả các tính năng đã được bàn giao.

3. Chuyển giao Sản phẩm Cuối cùng: Bàn giao chính thức mã nguồn, tài liệu, và quyền vận hành hệ thống cho nhóm vận hành/khách hàng.

4. Hoàn tất Thu mua/Hợp đồng: Đóng tất cả các hợp đồng với nhà cung cấp bên ngoài (ví dụ: thuê dịch vụ phát triển phần mềm, mua license).

Đầu ra:

1. **Báo cáo Đóng Dự án Cuối cùng:** Tài liệu tổng hợp hiệu suất, chi phí, tiến độ và tóm tắt các bài học kinh nghiệm.
2. **Cập nhật Tài sản Quy trình Tổ chức (OPA):** Bài học kinh nghiệm, hồ sơ dự án được lưu trữ trong kho dữ liệu của tổ chức để cải tiến.
3. **Chuyển đổi Dịch vụ/Sản phẩm/Kết quả:** Sản phẩm CNTT đã hoàn thành trở thành một phần của **hoạt động kinh doanh thường xuyên (Business As Usual - BAU)** của tổ chức.

Đóng Pha (Phase Closure)

- **Mục đích:** Hoàn tất chính thức một **giai đoạn cụ thể** trong dự án.
- **Trong CNTT:** Áp dụng thường xuyên trong các mô hình lặp (Iterative) hoặc Agile.
  - Ví dụ: Kết thúc giai đoạn **Phân tích Yêu cầu**, kết thúc một **Sprint** (trong Scrum), hoặc kết thúc giai đoạn **Thử nghiệm Beta**.
- **Sản phẩm:** Sản phẩm của pha được **xác nhận** và **chuyển giao** sang pha tiếp theo (ví dụ: Tài liệu Thiết kế Hệ thống được phê duyệt).
- **Kết quả:** Dẫn đến **quyết định tiếp tục** (Go/No-Go Decision) hoặc **chỉnh sửa** cho pha tiếp theo.

Đóng Dự án (Project Closure)

- **Mục đích:** Hoàn tất chính thức **toàn bộ dự án**.
- **Khi nào xảy ra?**
  - Tất cả các mục tiêu đã đạt được (**Thành công**).
  - Dự án bị hủy bỏ hoặc bị tạm dừng (**Thất bại/Tạm dừng**).
  - Nhu cầu kinh doanh không còn phù hợp.
- **Yêu cầu:** Bắt buộc phải thực hiện tất cả các hoạt động Đóng Dự án (thanh lý hợp đồng, thu thập bài học kinh nghiệm, giải tán đội nhóm).
- **Kết quả: Báo cáo Đóng Dự án Cuối cùng** và **Chuyển đổi Sản phẩm** sang vận hành.

Chuyển giao Sản phẩm (Deliverables) hoàn thiện

Hoạt động Cốt lõi:

1. Thu thập Chấp thuận Chính thức (Formal Acceptance)

- **Xác nhận Phạm vi:** So sánh sản phẩm (hệ thống) hoàn thiện với yêu cầu ban đầu (Scope Statement).
- **Biên bản Nghiệm thu:** Đây là tài liệu pháp lý xác nhận khách hàng/nhà tài trợ đồng ý rằng sản phẩm đã **đáp ứng tất cả các tiêu chí** được quy định trong hợp đồng.
- *Trong CNTT:* Thường là **UAT Sign-off** (Biên bản chấp thuận người dùng cuối) và xác nhận rằng tất cả các lỗi nghiêm trọng đã được khắc phục.

2. Triển khai và Bàn giao (Deployment & Handover)

- **Triển khai Cuối cùng:** Cài đặt hệ thống vào môi trường sản xuất (Production Environment) và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
- **Chuyển giao Quyền sở hữu:** Bàn giao quyền truy cập (access), quyền quản trị hệ thống, và các **Giấy phép (Licenses)** liên quan cho nhóm vận hành/khách hàng.

3. Bàn giao Kiến thức (Knowledge Transfer)

- **Tài liệu Hóa:** Chuyển giao tất cả các tài liệu kỹ thuật, kiến trúc hệ thống, mã nguồn (Source Code) và hướng dẫn vận hành cho nhóm bảo trì.
- **Đào tạo:** Đảm bảo nhóm vận hành và người dùng cuối đã được đào tạo đầy đủ để sử dụng và hỗ trợ hệ thống mới.

Các hạng mục cần bàn giao trong dự án CNTT

1. Sản phẩm Phần mềm/Hệ thống (System/Product)

Đây là sản phẩm cốt lõi của dự án.

- **Mã nguồn (Source Code):** Toàn bộ mã nguồn đã được kiểm thử, đóng gói, bao gồm cả mã cho các thành phần front-end, back-end, và các script triển khai.
  - *Yêu cầu:* Mã nguồn phải được lưu trữ trong kho lưu trữ chính thức (ví dụ: Git repository) với lịch sử phiên bản hoàn chỉnh.
- **File Cài đặt/Triển khai (Deployment Files):** Các file binary, container images (Docker, Kubernetes), hoặc script để cài đặt và chạy ứng dụng trong môi trường sản xuất.
- **Cơ sở Dữ liệu (Database):** Cấu trúc (schema), script khởi tạo dữ liệu, và các quy tắc quản lý dữ liệu.

2. Tài liệu Kỹ thuật và Vận hành (Technical & Operations)

Tài liệu hóa là yếu tố sống còn cho việc bảo trì hệ thống.

- **Thiết kế Hệ thống và Kiến trúc (System Design & Architecture):** Sơ đồ chi tiết về cấu trúc hệ thống, các thành phần tương tác, và công nghệ sử dụng.
- **Hướng dẫn Vận hành và Bảo trì (Operations Manual):** Hướng dẫn chi tiết cách khởi động, tắt, giám sát (monitoring), sao lưu (backup) và khôi phục (recovery) hệ thống.
- **Kế hoạch Khắc phục Thảm họa (Disaster Recovery Plan - DRP):** Quy trình chi tiết để phục hồi hệ thống khi có sự cố nghiêm trọng.
- **Hồ sơ Kiểm thử (Test Cases & Results):** Các trường hợp kiểm thử (test cases) đã thực hiện và kết quả cuối cùng.

3. Tài liệu Người dùng và Pháp lý (User & Legal)

Đảm bảo tính pháp lý và khả năng sử dụng của hệ thống.

- **Hướng dẫn Sử dụng (User Manual):** Tài liệu chi tiết cho người dùng cuối về cách tương tác với hệ thống.
- **Module Đào tạo:** Nội dung, tài liệu, và video đã sử dụng để đào tạo người dùng và nhóm hỗ trợ.
- **Giấy phép (Licenses) & Bảo hành (Warranties):** Tất cả các giấy phép phần mềm, phần cứng đã mua (đặc biệt là các thư viện bên thứ ba) và các điều khoản bảo hành liên quan.

Đào tạo và hỗ trợ sau triển khai

1. Đào tạo Người dùng Cuối (End-User Training)

- **Mục đích:** Giúp người dùng cuối thành thạo các tính năng và quy trình nghiệp vụ mới trên hệ thống.
- **Hoạt động:**
  - **Buổi đào tạo thực hành:** Tổ chức các lớp học thực tế (hands-on sessions) theo vai trò (role-based) của người dùng.
  - **Tài liệu đào tạo:** Cung cấp Hướng dẫn sử dụng, video hướng dẫn, và FAQs (Câu hỏi thường gặp) dễ tiếp cận.
  - **Xác nhận:** Đảm bảo người dùng cuối có thể thực hiện các nhiệm vụ cơ bản trước khi dự án đóng.

2. Đào tạo Nhóm Vận hành và Hỗ trợ (Operations & Support Team)

- **Mục đích:** Chuyển giao kiến thức kỹ thuật sâu (technical know-how) để nhóm hỗ trợ có thể xử lý các vấn đề phát sinh.
- **Hoạt động:**
  - **Chuyển giao Kiến thức Chuyên sâu (KT - Knowledge Transfer):** Nhóm phát triển hướng dẫn chi tiết về kiến trúc, mã nguồn, cấu hình máy chủ, và quy trình khắc phục sự cố cấp độ 1 & 2.
  - **Thực hành Bảo trì:** Cho phép nhóm vận hành thực hiện các nhiệm vụ bảo trì và giám sát (monitoring) dưới sự giám sát của nhóm dự án.

Quản lý giai đoạn bảo hành

Giai đoạn Bảo hành (Warranty Period): Một khoảng thời gian sau khi bàn giao chính thức, trong đó nhóm dự án (hoặc nhà thầu) chịu trách nhiệm sửa chữa các lỗi phát sinh (**Bugs/Defects**) không lường trước được.

Cần xác định rõ ranh giới giữa:

- **Sửa lỗi (Bug Fixes):** Thuộc trách nhiệm bảo hành (thường do nhóm dự án chi trả).
- **Yêu cầu Thay đổi (Enhancements/Changes):** Các tính năng mới hoặc thay đổi phạm vi, cần được xử lý như một dự án hoặc yêu cầu bảo trì riêng biệt (thường do khách hàng chi trả).

*Một dự án CNTT chỉ thực sự thành công khi **người dùng có thể sử dụng** và **hệ thống có thể được duy trì** mà không cần sự can thiệp liên tục của nhóm phát triển ban đầu.*

Thanh lý Hợp đồng

1. Kiểm toán Thu mua (Procurement Audits)

- **Mục đích:** Xem xét lại toàn bộ quy trình thu mua từ đầu đến cuối để đảm bảo mọi điều khoản và điều kiện của hợp đồng đã được **tuân thủ**.
- **Trong CNTT:** Kiểm tra việc sử dụng **Giấy phép (Licenses)**, sự tuân thủ các quy tắc bảo mật và chất lượng (đặc biệt đối với các nhà thầu phần mềm thuê ngoài).
- **Kết quả:** Xác định các thành công và thất bại của quy trình thu mua để làm đầu vào cho Bài học Kinh nghiệm (Lessons Learned).

2. Hoàn tất các Nghĩa vụ Tài chính

- **Thanh toán Cuối cùng (Final Payment):** Thực hiện các khoản thanh toán cuối cùng đã thỏa thuận với nhà cung cấp/nhà thầu phụ sau khi xác nhận chất lượng và sự chấp nhận của sản phẩm hoặc dịch vụ CNTT (ví dụ: tư vấn, phần cứng, dịch vụ đám mây).
- **Giải quyết Tranh chấp:** Nếu có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào (ví dụ: về chất lượng mã nguồn hoặc dịch vụ bị chậm trễ), chúng phải được giải quyết hoặc đạt được thỏa thuận chính thức trước khi đóng hợp đồng.

3. Đóng Hợp đồng Chính thức

- **Thông báo Chính thức:** Gửi thông báo bằng văn bản đến nhà cung cấp để xác nhận hợp đồng đã được thực hiện đầy đủ và chính thức kết thúc.
- **Lưu trữ Hồ sơ:** Lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến hợp đồng và thu mua (hồ sơ mời thầu, hợp đồng đã ký, biên bản nghiệm thu, hóa đơn) vào kho dữ liệu dự án.

Lưu ý trong thanh lý hợp đồng CNTT đặc thù

1. Quyền Sở hữu Trí tuệ (IP - Intellectual Property)

- **Xác nhận Quyền Sở hữu:** Đảm bảo các điều khoản hợp đồng đã quy định rõ ràng về việc **chuyển giao đầy đủ** quyền sở hữu trí tuệ của **Mã nguồn** và **Tài liệu** cho tổ chức của bạn (hoặc cho khách hàng).
- **Sản phẩm Thuê ngoài:** Đặc biệt quan trọng đối với các dự án phát triển phần mềm thuê ngoài (Outsourcing) để tránh tranh chấp pháp lý sau này về bản quyền.

2. Giấy phép Phần mềm và Bản quyền (Licensing)

- **Kiểm tra Giấy phép:** Xác minh rằng tất cả các **Giấy phép** phần mềm, công cụ, hoặc thư viện bên thứ ba đã được mua hợp lệ và có thể được sử dụng liên tục bởi nhóm vận hành (O&M).
- **Trách nhiệm Duy trì:** Đảm bảo rằng trách nhiệm gia hạn và tuân thủ các điều khoản cấp phép đã được chuyển giao rõ ràng từ nhóm dự án sang nhóm vận hành.

Lưu ý trong thanh lý hợp đồng CNTT đặc thù

3. Thỏa thuận Bảo mật (NDA) và Bảo mật Dữ liệu

- **Tuân thủ NDA:** Xác nhận rằng tất cả các cá nhân và tổ chức bên ngoài đã ký NDA đều đã tuân thủ các quy tắc bảo mật trong suốt thời gian dự án.
- **Xóa bỏ Dữ liệu:** Đảm bảo nhà thầu phụ hoặc các bên thứ ba khác đã truy cập vào hệ thống hoặc dữ liệu nhạy cảm của tổ chức đã **xóa bỏ an toàn** mọi bản sao dữ liệu theo yêu cầu và quy định pháp luật (ví dụ: GDPR, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân).

4. Điều khoản Bảo hành và Hỗ trợ (Warranty & Support)

- **Khởi động Bảo hành:** Xác định chính xác **ngày bắt đầu** của giai đoạn bảo hành/hỗ trợ đã thỏa thuận sau khi nghiệm thu.
- **Phân định Trách nhiệm:** Làm rõ trách nhiệm của nhà thầu đối với các lỗi phát sinh (**Bugs**) so với các yêu cầu thay đổi (Scope Changes) trong giai đoạn sau triển khai.

Giải tán Nhóm Dự án (Team Release)

Chuyển giao các thành viên nhóm dự án một cách có tổ chức sang các công việc, dự án hoặc vai trò tiếp theo, đồng thời công nhận và đánh giá nỗ lực của họ.

1. Đánh giá và Phản hồi Hiệu suất (Performance Review)

- **Đánh giá Cá nhân:** Tiến hành đánh giá hiệu suất cuối cùng cho từng thành viên.
  - Xem xét sự đóng góp của họ đối với các mục tiêu kỹ thuật, tiến độ, và chất lượng sản phẩm CNTT.
- **Cung cấp Phản hồi (Feedback):** Cung cấp phản hồi mang tính xây dựng về điểm mạnh và các lĩnh vực cần cải thiện (ví dụ: kỹ năng lập trình, giao tiếp, quản lý thời gian).
- **Cập nhật Hồ sơ:** Đảm bảo hồ sơ năng lực của nhân viên được cập nhật chính xác với các kỹ năng và kinh nghiệm mới đạt được từ dự án này.

2. Quản lý Nguồn lực (Resource Management)

- **Phân bổ lại:** Phối hợp với người quản lý chức năng (Functional Managers) hoặc Văn phòng Quản lý Dự án (PMO) để **chuyển giao** các thành viên sang các dự án hoặc bộ phận khác một cách có kế hoạch.
- **Giải phóng Tài nguyên:** Thu hồi tất cả các tài nguyên CNTT đã cấp cho dự án (máy tính xách tay chuyên dụng, quyền truy cập vào hệ thống, giấy phép phần mềm đã hết hạn).

Giải tán Nhóm Dự án (Team Release)

3. Công nhận Thành tích (Recognition & Celebration)

- **Ghi nhận Nỗ lực:** Tổ chức một buổi lễ tổng kết hoặc sự kiện nhỏ để **công nhận chính thức** những thành tựu của toàn bộ nhóm và từng cá nhân (ví dụ: hoàn thành triển khai phức tạp, vượt qua thử thách kỹ thuật lớn).
- **Tăng cường Động lực:** Việc công nhận đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững tinh thần và động lực cho nhân viên trong các dự án tương lai.

Việc giải tán nhóm phải được thực hiện chuyên nghiệp và nhân văn. ***Đánh giá và công nhận*** *là chìa khóa để giữ chân các chuyên gia CNTT giỏi và duy trì văn hóa làm việc tích cực.*

Thu thập bài học kinh nghiệm (Lessons Learned)

Phân tích những gì đã làm tốt và những gì cần cải thiện, sau đó lưu trữ kiến thức này để cải tiến quy trình quản lý dự án và phát triển CNTT trong tương lai.

1. Tổ chức Họp Tổng kết (Retrospective/Closeout Meeting)

- **Thành phần:** Bao gồm nhóm dự án, các bên liên quan chính (ví dụ: đại diện khách hàng, nhà tài trợ), và Quản lý chức năng.
- **Hình thức:** Buổi họp mở, trung thực, không đổ lỗi để thảo luận các vấn đề cốt lõi:
  - **Thành công:** Những điểm nào đã giúp chúng ta đạt được mục tiêu? (Ví dụ: Công cụ CI/CD mới đã hoạt động rất hiệu quả).
  - **Thất bại/Thách thức:** Điều gì đã cản trở dự án? (Ví dụ: Quy trình phê duyệt yêu cầu quá chậm).
  - **Cải tiến:** Những hành động cụ thể nào cần thực hiện trong dự án tiếp theo?

Thu thập bài học kinh nghiệm (Lessons Learned)

2. Phân tích dữ liệu hiệu suất

- **So sánh Kế hoạch vs. Thực tế:** Phân tích sự chênh lệch lớn nhất giữa **Đường cơ sở** (Phạm vi, Tiến độ, Chi phí) với kết quả cuối cùng.
  - **Ví dụ:** Tại sao **Chi phí** vượt 15%? (Do ước tính ban đầu sai, hay do Scope Creep?)
- **Đánh giá Rủi ro:** Xem xét các rủi ro đã được xác định có xảy ra không, và kế hoạch ứng phó rủi ro có hiệu quả không.

3. Tài liệu hóa bài học kinh nghiệm

- **Cấu trúc:** Ghi nhận các bài học theo cấu trúc rõ ràng: **Vấn đề → Nguyên nhân gốc rễ → Đề xuất Hành động Cải tiến**.
- **Lưu trữ:** Đảm bảo tất cả các bài học kinh nghiệm được lưu trữ tập trung và dễ dàng truy cập trong **Kho dữ liệu Tổ chức (Organizational Process Assets - OPA)**.

*Bài học kinh nghiệm là **tài sản trí tuệ** quý của dự án.*
Nếu chúng ta không học hỏi từ kinh nghiệm, chúng ta sẽ lặp lại cùng một sai lầm trong các dự án tiếp theo.

Các bài học kinh nghiệm tiêu biểu trong CNTT

1. Lĩnh vực Yêu cầu (Requirements)

- **Vấn đề:** Yêu cầu người dùng thay đổi quá nhiều sau khi thiết kế đã được phê duyệt.
- **Bài học: Cần đầu tư thêm thời gian** vào giai đoạn Khám phá (Discovery) để xây dựng **User Story Mapping** chi tiết hoặc tạo **Prototype** sớm hơn để khóa yêu cầu.
- **Hành động Cải tiến:** Bắt buộc có các buổi họp **Xác nhận Phạm vi Chính thức** sau mỗi pha và hạn chế thay đổi trong vòng đời Sprint (đối với Agile).

2. Lĩnh vực Công nghệ và Kỹ thuật (Technology & Technical)

- **Vấn đề:** Công cụ/Thư viện mã nguồn mở mới được chọn có lỗ hổng bảo mật hoặc không tương thích với các hệ thống hiện có.
- **Bài học:** Quy trình **đánh giá công nghệ** cần bao gồm giai đoạn **Proof of Concept (PoC)** bắt buộc, tập trung vào **tích hợp** và **bảo mật** trước khi triển khai rộng rãi.
- **Hành động Cải tiến:** Xây dựng **danh sách Công nghệ được Phê duyệt (Approved Technology Stack)** cho các dự án tương lai.

Các bài học kinh nghiệm tiêu biểu trong CNTT

3. Lĩnh vực Tiến độ và Ước tính (Schedule & Estimation)

- **Vấn đề:** Thời gian ước tính cho các nhiệm vụ **DevOps/Triển khai** (ví dụ: cấu hình môi trường, tự động hóa kiểm thử) luôn bị thiếu hụt nghiêm trọng.
- **Bài học:** Các nhiệm vụ **phi chức năng (non-functional)** và hoạt động **hệ thống** cần được ước tính **riêng biệt** và bổ sung thêm hệ số dự phòng (contingency factor) vào **Đường cơ sở Tiến độ**.
- **Hành động Cải tiến:** Sử dụng **Dữ liệu Lịch sử** từ dự án này để hiệu chỉnh công cụ ước tính (Estimation Tool) cho lần sau.

4. Lĩnh vực Rủi ro và Nhân sự (Risk & HR)

- **Vấn đề:** Mất đi một lập trình viên cấp cao (key person risk) làm chậm tiến độ đáng kể.
- **Bài học:** Cần xây dựng **Kế hoạch Chuyển giao Kiến thức (KT Plan)** sớm hơn trong vòng đời dự án và có ít nhất hai người (primary/secondary) hiểu về các module quan trọng.
- **Hành động Cải tiến:** Bắt buộc có các buổi **pair programming** hoặc **code review** chéo để chia sẻ tri thức.

*Hãy làm cho bài học kinh nghiệm trở nên **cụ thể và có thể hành động được** (actionable),*
*tập trung vào việc thay đổi **quy trình** chứ không phải đổ lỗi cho cá nhân.*

Đóng dự án chính thức và công bố

Chính thức kết thúc dự án về mặt hành chính, tài liệu hóa kết quả cuối cùng, và truyền thông thông tin này đến các bên liên quan.

1. Báo cáo Đóng Dự án Cuối cùng (Final Project Closure Report): đây là tài liệu tổng hợp và chính thức xác nhận việc kết thúc.

- **Nội dung Báo cáo:**
  1. **Tóm tắt Hiệu suất:** So sánh mục tiêu ban đầu (Phạm vi, Chi phí, Tiến độ) với kết quả thực tế.
  2. **Tình trạng Sản phẩm:** Xác nhận sản phẩm cuối cùng đã được chấp nhận và bàn giao.
  3. **Tóm tắt Thu mua:** Xác nhận tất cả các hợp đồng đã được đóng.
  4. **Tóm tắt Bài học Kinh nghiệm:** Các điểm chính được rút ra từ dự án.
  5. **Đề xuất Hành động:** Các đề xuất chuyển tiếp sang hoạt động vận hành và bảo trì (O&M).

Đóng dự án chính thức và công bố

2. Hoàn tất Lưu trữ Hồ sơ (Archiving)

Mục đích: Cung cấp hồ sơ tham khảo cho các dự án và kiểm toán trong tương lai.

Loại hồ sơ	Nội dung chính	Mục đích
Pháp lý/Hợp đồng	Hợp đồng đã ký, Thỏa thuận NDA, Biên bản Nghiệm thu Chính thức, Hồ sơ Sở hữu Trí tuệ (IP).	Bằng chứng pháp lý và tuân thủ.
Tài chính/Thu mua	Hóa đơn cuối cùng, Hồ sơ thanh toán, Báo cáo Chi phí cuối cùng.	Phục vụ kiểm toán và báo cáo tài chính.
Kỹ thuật/Sản phẩm	Mã nguồn cuối cùng, Tài liệu Kiến trúc, Hướng dẫn Vận hành, Hồ sơ Kiểm thử đầy đủ.	Hỗ trợ bảo trì và phát triển trong tương lai.
Quản lý/Lịch sử	Kế hoạch dự án đã được phê duyệt, Báo cáo Đóng Dự án, Nhật ký Rủi ro/Vấn đề, Bài học Kinh nghiệm.	Nguồn tham khảo cho các dự án và quy trình quản lý dự án (PM).

Đóng dự án chính thức và công bố

3. Công bố Chính thức

- **Thông báo Nội bộ:** Thông báo chính thức cho ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan rằng dự án đã hoàn thành thành công (hoặc kết thúc) và hệ thống đã chuyển sang trạng thái vận hành.
- **Thông báo Khách hàng/Đối tác:** Gửi thư hoặc thông báo chính thức cho khách hàng/nhà tài trợ, cảm ơn sự hợp tác và xác nhận việc bàn giao.

*Báo cáo đóng dự án là **dấu chấm hết chính thức** của dự án, biến các hoạt động thành hồ sơ lịch sử và là căn cứ cho sự thành công của tổ chức.*

Tóm tắt và Kết luận

❖ Đóng Dự án:

- **Hoàn tất chính thức:** Đóng dự án là một **yêu cầu hành chính, pháp lý và tài chính** bắt buộc, không phải chỉ là lễ kỷ niệm.
- **Mục tiêu:** Đảm bảo dự án có một **dấu chấm hết rõ ràng** và mọi nghĩa vụ (hợp đồng, tài chính, nhân sự) đều được thanh lý.

❖ Ba trụ cột thành công của giai đoạn đóng dự án:

Trụ cột	Hoạt động Chính	Giá trị Mang lại
Xác nhận & Chuyển giao	Thu thập **Chấp thuận Chính thức** (UAT Sign-off) và Bàn giao **Hệ thống + Tài liệu** cho nhóm Vận hành.	Hệ thống được đưa vào sử dụng **bền vững** (Sustainable).
Thanh lý	**Đóng Hợp đồng** và **Giải tán Nhóm** một cách chuyên nghiệp.	Loại bỏ **rủi ro pháp lý/tài chính** còn tồn đọng.
Bảo toàn Tri thức	Thu thập và Lưu trữ **Bài học Kinh nghiệm (Lessons Learned)**, **Mã nguồn**, và **Hồ sơ Lịch sử**.	Thúc đẩy **Trưởng thành Tổ chức** cho các dự án CNTT tiếp theo.

Q & A

